

福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事の概要

1. 工事概要

工事名 : 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事
 施工場所 : 広島県福山市箕沖町地先
 工期 : 令和8年3月24日 ~ 令和8年12月15日
 発注者 : 中国地方整備局 広島港湾・空港整備事務所 福山港・尾道糸崎港出張所
 受注者 : 東亜・青木特定建設工事共同企業体
 TEL : 090-6296-1979 (箕島JV作業所)
 工事概要 : 鉄鋼業や造船業等の国際競争力の維持・強化を図るため、福山港において、ふ頭の再編を併せて港湾施設の改良を行うもので、その内の岸壁工事を行う。

2. 工事概略工程表

工種	単位	数量	令和8年											
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
準備工	式	1	[Bar chart showing preparation work from March to April]											
鋼矢板製作	枚	43	[Bar chart showing steel sheet pile production from May to June]											
鋼矢板打設	枚	43	[Bar chart showing steel sheet pile driving from July to July]											
鋼管矢板製作	本	105	[Bar chart showing steel pipe sheet pile production from May to August]											
鋼管矢板打設	本	105	[Bar chart showing steel pipe sheet pile driving from September to November]											
後片付け	式	1	[Bar chart showing cleanup from November to December]											

— 施工予定時期

3. 施工箇所




4. 作業概要



作業状況図 (鋼管矢板施工イメージ)



作業状況図 (鋼矢板作業イメージ)

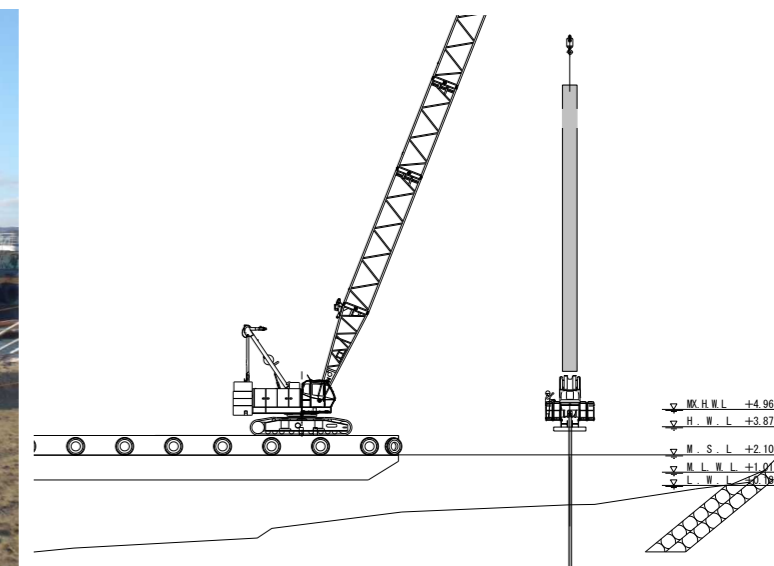

【主要工事内容】

- 鋼管矢板
 - ・鋼管矢板(・直径0.8m、長さ28.5m~24.2m)計105本の打設を作業船にて行います。
- 鋼矢板
 - ・鋼矢板(SYW390、長さ16.5m)43枚の打設を作業船にて行います。
- その他
 - ・作業船の配備時は、安全監視船を配置し一般船舶の支障とならないようにします。
 - ・振動に留意した機器を選定し、同時に振動計にて現場状況を管理いたします。
